PRE – Projektentwicklung

Projektkoordination

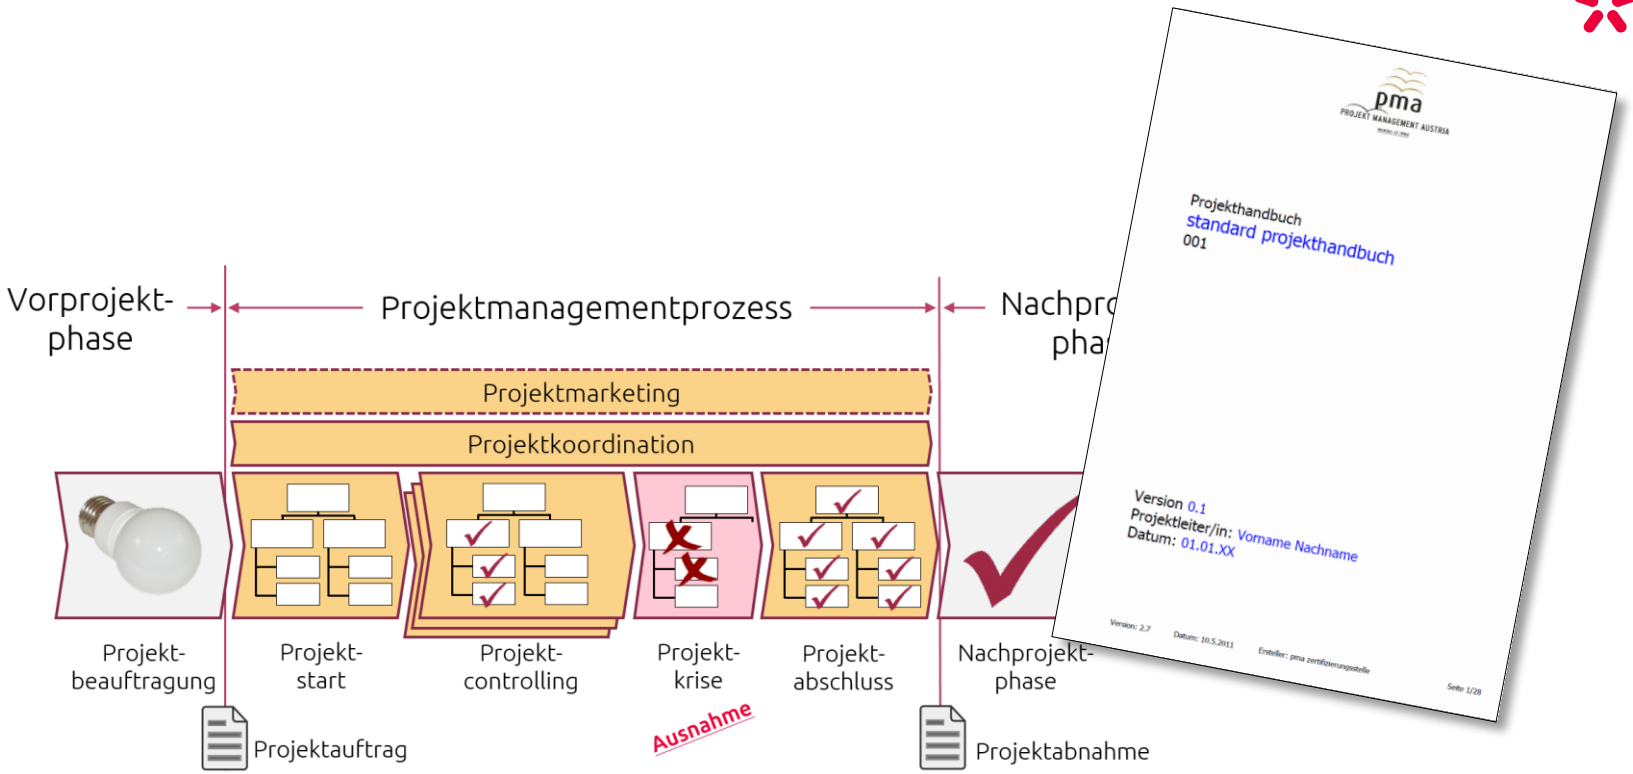

V03 20180628

Peter Divjak

Agenda - Lernziele

- Projektkoordination und die PMA
- Information - Kommunikation
- Arbeitspaketabnahme
- Protokolle
- ToDo Listen

Projektmanagementprozess

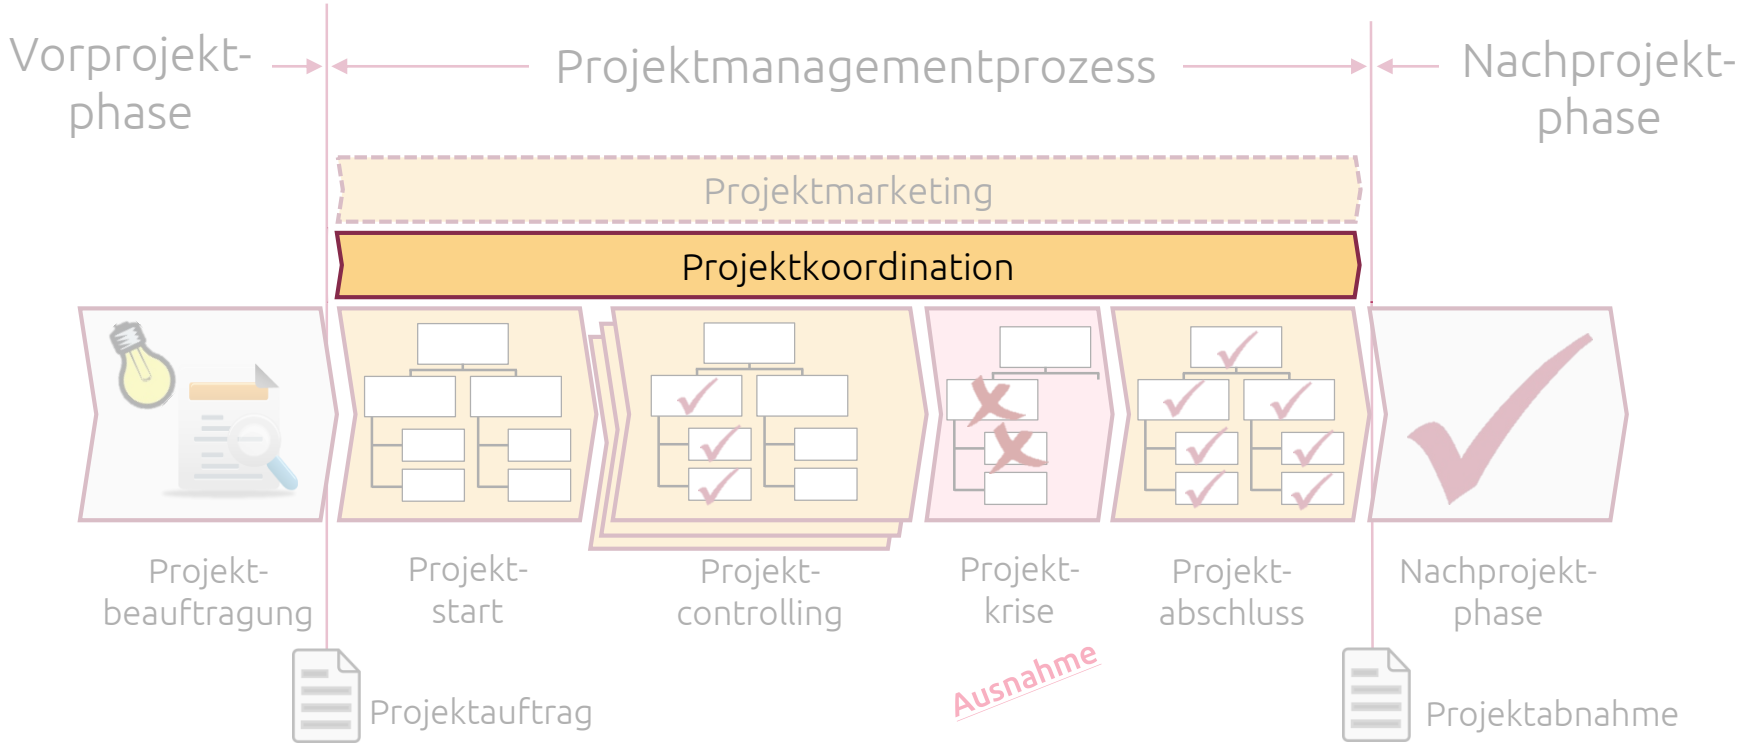

Der Projektkoordiantions-Prozess erfolgt kontinuierlich über die gesamte Dauer des Projekts

Übung 1: Projektkoordination PMA

- Arbeite alleine…
- Erstelle ein WORD Dokument – beachtet die Form (Dateiname, Kopf- Fußzeile usw.)

1. Was sind die wesentlichen Elemente des Projektkoordination -Prozesses laut pm Baseline und pm Basic Syllabus?
2. Was findet ihr im PHB zum Thema Projektkoordination?

Das sagt die PMA dazu…

und die Erstellung der Basisversion der Projektmanagement-Dokumentation.

1.2.3 Teilprozess Projektkoordination

Die Aufgaben der Projektkoordination sind die laufende Sicherung des Projektfortschritts, die laufende Sicherung der adäquaten Informationen für Projektteammitglieder, Projektmitarbeiterin und Vertreterin relevanter Umwelten, sowie die laufende Unterstützung der Erfüllung einzelner Arbeitspakete. Die Projektkoordination startet mit der Projektbeauftragung und endet mit der Projektabnahme. Die Projektkoordination beinhaltet: Laufende Qualitätssicherung der (Zwischen-) Ergebnisse von Arbeitspaketen, laufende Kommunikation der Projektmanagerin mit Projektteammitgliedern und der Projektauftraggeberin, laufende Gestaltung der Beziehungen zu relevanten Umwelten und die Disposition von Projektressourcen.

Version 3.0 - August 2008 © pma – PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA Seite 11

3.1 Abnahme Arbeitspakete

standard projekthandbuch 001

ABNAHME ARBEITSPAKETE

PSP-Code	Arbeitspaket	AP-Verantw.	Datum	Abnahme durch	Unterschrift

Protokolle

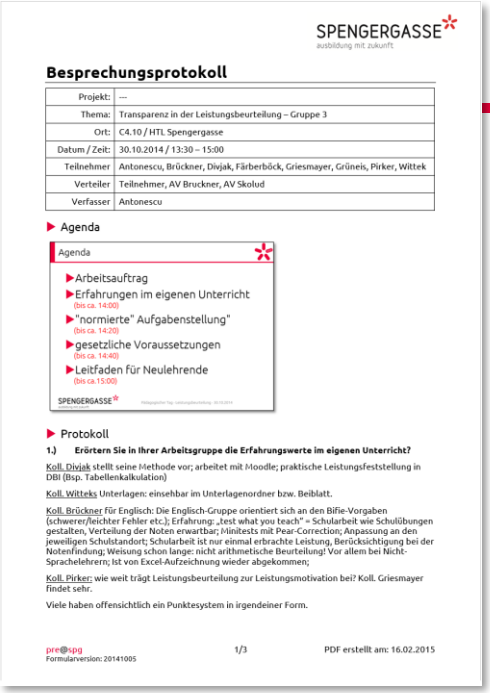

SPENGERGASSE
ausbildung mit zukunft

Besprechungsprotokoll

Projekt:	---
Thema:	Transparenz in der Leistungsbeurteilung – Gruppe 3
Ort:	C4.10 / HTL Spengergasse
Datum / Zeit:	30.10.2014 / 13:30 – 15:00
Teilnehmer	Antonescu, Brückner, Divjak, Färberböck, Griesmayer, Grüneis, Pirker, Wittek
Verteiler	Teilnehmer, AV Bruckner, AV Skolud
Verfasser	Antonescu

▶ Agenda

Agenda
- ▶Arbeitsauftrag
- ▶Erfahrungen im eigenen Unterricht (bis ca. 14:00)
- ▶"normierte" Aufgabenstellung" (bis ca. 14:20)
- ▶gesetzliche Voraussetzungen (bis ca. 14:40)
- ▶Leitfaden für Neulehrende (bis ca 15:00)

SPENGERGASSE

▶ Protokoll

1.) Erörtern Sie in Ihrer Arbeitsgruppe die Erfahrungswerte im eigenen Unterricht?

Koll. Divjak stellt seine Methode vor; arbeitet mit Moodle; praktische Leistungsfeststellung in DBI (Bsp. Tabellenkalkulation)

Koll. Witteks Unterlagen: einsehbar im Unterlagenordner bzw. Beiblatt.

Koll. Brückner für Englisch: Die Englisch-Gruppe orientiert sich an den Bifie-Vorgaben (schwerer/leichter Fehler etc.); Erfahrung: „test what you teach" = Schularbeit wie Schulübungen gestalten, Verteilung der Noten erwartbar; Minitests mit Pear-Correction; Anpassung an den jeweiligen Schulstandort; Schularbeit ist nur einmal erbrachte Leistung, Berücksichtigung bei der Notenfindung; Weisung schon lange: nicht arithmetische Beurteilung! Vor allem bei Nicht-Sprachelehrern; ist von Excel-Aufzeichnung wieder abgekommen;

Koll. Pirker: wie weit trägt Leistungsbeurteilung zur Leistungsmotivation bei? Koll. Griesmayer findet sehr.

Viele haben offensichtlich ein Punktesystem in irgendeiner Form.

pre@spg
Formularversion: 20141005 1/3 PDF erstellt am: 16.02.2015

▶ ToDo Liste

Task	Person	Termin
Kontrolle der Diplomprojekte der Abendschule („CopyChecker", „obehave" (kaufmännisches Projekt))	Markus Puchhammer	23.10.2015
Einteilung der Vorstudienpräsentation für Anfang November (HIF, HBGM)	AV Georg Bruckner, AV Theo Skolud	15.10.2015
Gesamtliste der Projekte (Name des Lehrers anstelle des Lehrerkürzels)	Harald Wittek	28.10.2015
PMA Zertifizierung – was kann bei Level C (Level D) bezüglich des PRE Unterrichts angerechnet werden	*Harald Wittek*	*1.12.2015*

Sitzungen / Besprechungen → Protokolle → ToDo Listen

EINE Besprechung OHNE Protokoll / ToDo Liste ist wie KEINE Besprechung!!

Inhalte Besprechungsprotokoll

- Projekt, Thema des Meetings
- Name des Protokollverfassers

nicht zu wichtig DAUER ist wichtig (man darf bei der Diplomarbeit nicht während des Unterrrichts arbeiten, kann daher problematisch sein)

- Zeit, Dauer (Beginn/Ende), Ort, Teilnehmer (auch Liste fehlender Teilnehmer)
- Aufstellung der Tagesordnungspunkte (Agenda)
- Inhalte der Besprechung (im Detail)
- Ergebnisse der Besprechung, z.B. getroffene Entscheidungen
- ToDo-Liste bestehend aus: **WAS** (Tasks) **BIS WANN** (Termin) **von WEM** (Personen) zu erledigen ist

Beispiel Protokoll(vorlage)

SPENGERGASSE
ausbildung mit zukunft

Besprechungsprotokoll

Projekt:	
Thema:	
Ort:	
Datum / Zeit:	
Teilnehmer	
Verteiler	
Verfasser	

Agenda

1. Vorstellung
2. ...
3. allfälliges

Protokoll

ToDo Liste

Task	Person	Termin

Beispiel "allgemeine" ToDo Liste

Aufbau z.B. auf Basis der Betrachtungsobjekte, Phasen, Arbeitspakete,...

20150216 ToDo Liste v01.xlsx - Excel

DATEI START EINFÜGEN SEITENLAYOUT FORMELN DATEN ÜBERPRÜFEN ANSICHT ENTWICKLERTOOLS AUSL

B9 | in Arbeit

ToDo Liste "EasyKey"

A - Datenbank

Nr	Status	Bearbeiter	PSP Code	Termin	Aufgabe/Funktion/Modul	Inhalt	Anmerkungen
A1	fertig	JR	3.1.4	20.02.2015	Datenstruktur Haupttabelle	Erstellung der "Haupttabelle zu Beachten: Feldnamen (keine Leerzeichen, keine Umlaute, nur Kleinbuchstaben...) und Datentypen	Auf Basis der Exporttabelle und Importtabelle - alle Felder müssen vorhanden sein
A2	fertig	DP	3.1.4	20.02.2015	Feld "gelöscht"	Zusatzfeld für Löschmarker (es sollen ja nicht wirklich Daten gelöscht werden	
A3	kritisch	DP	3.1.4	20.02.2015	Feld "intern"	Für Datensätze die direkt in Applikation eingegeben werden	Funktionen der GUI wie Update und Delete dürfen nur interne Datensätze betreffen - die externen Datensätze (aus SAP) dürfen nicht verändert werden (ausser TID)
A4	in Arbeit	PUC	3.1.4	20.02.2015	Feld "Titel"	Feld Titel wurde von Kunden gewünscht - in Punkt 1 enthalten?	

B - Mitarbeiterverwaltung

Nr	Status	Bearbeiter	PSP Code	Termin	Aufgabe/Funktion/Modul	Inhalt	Anmerkungen
B1	fertig	JR	4.2.3	28.02.2015	Anlegen neuer "interner" Mitarbeiter	Anlage neuer Mitarbeiter, Vergabe einer eigenen Mitarbeiternummer (PK), Autowert kann nicht verwendet werden da PK sonst vom SAP System, Flag "intern" muss dabei gesetzt werden	
B2	in Arbeit	DP	4.2.3	28.02.2015	Ändern "interner" Mitarbeiter	Nur wenn Flag "intern" gesetzt ist kann mman Daten des Mitarbeiters verändern	
B3	in Arbeit	PUC	4.2.3	28.02.2015	Löschen "interner" Mitarbeiter	nur bei internen Mitarbeitern kann das "Löschflag" gesetzt werden	
B4	in Arbeit	JR	4.2.3	28.02.2015	Suchen von Mitarbeiter	Umfangreiche Suchfunktion nach diversen Attributen	

Übung 2: ToDo Liste

- Arbeitet im Team…
- Erstellt in der aktuellen Projektgruppe für euer aktuelles Projekt eine "allgemeine" ToDo Liste für die noch offenen Tätigkeiten
- Orden jedem Task das passende Arbeitspaket zu
- Trefft realistische Termine (in Abstimmung mit dem Gantt-Diagramm)
- Gibt es "kritische" Aufgaben?

moodle

Abgabe hinzufügen
