PRE – Projektentwicklung

Projektcontrolling

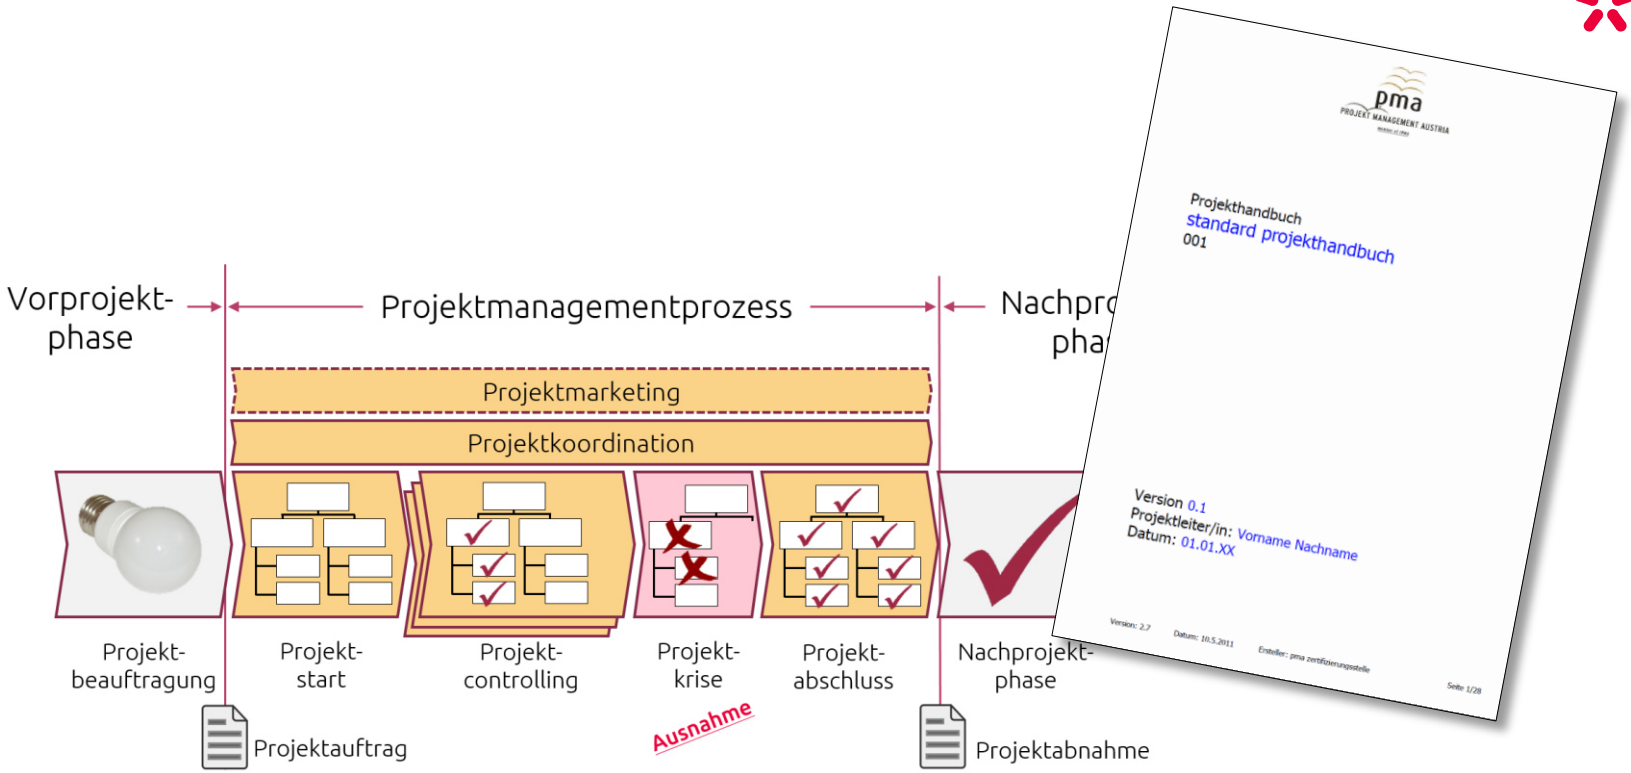

V04 20200511

Heinz Peter Schindelar

Agenda - Lernziele

- Projektcontrolling – Definition
- Projektcontrolling-Zyklus
  - Kontrolle (Soll / Ist Vergleich)
  - Steuerung
  - Neuplanung
  - Statusbericht
- Weitere Methoden (Ausblick)

Projektcontrolling – Definition (PMA)

1.2.4 Teilprozess Projektcontrolling

Die Aufgaben des Projektcontrollings sind die Feststellung des Projektstatus, das Review der Konstruktion des "Big Project Picture", die Vereinbarung bzw. die Vornahme steuernder Maßnahmen, die Weiterentwicklung der Projektorganisation und der Projektkultur, die Erstellung von Fortschrittsberichten, die Neugestaltung der Projekt-Kontext-Beziehungen und die Durchführung von Projektmarketingmaßnahmen. Eine Neuvereinbarung von Projektzielen kann unter bestimmten Rahmenbedingungen erforderlich sein. Der Projektcontrollingprozess findet stichtagsbezogen mehrmals im Rahmen eines Projekts statt und startet mit der Veranlassung des Projektcontrollings und endet, wenn der jeweilig freigegebene Projektfortschrittsbericht abgelegt ist.

1.2.5 Teilprozess Projektmarketing

Projektcontrolling - Definition

- wiederkehrender, zyklischer PM-Prozess
- Häufigkeit sollte beim Projektstart definiert werden (z.B. alle 4 Wochen)
- Durchführung: Projektteam (Verantwortlich: PL)

Hard Facts

- Projektziele
- Leistungen
- Termine
- Ressourcen/Kosten
- Risiken

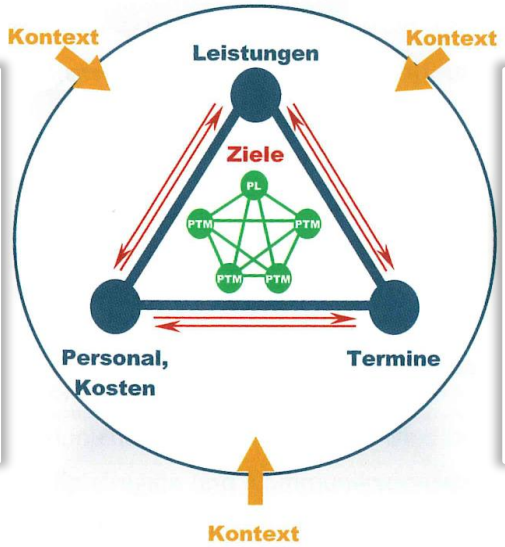

Soft Facts

- Projektorganisation
- Projektkultur (Regeln)
- Projektumwelten
- Kontext zu anderen Projekten

Projektcontrolling-Zyklus

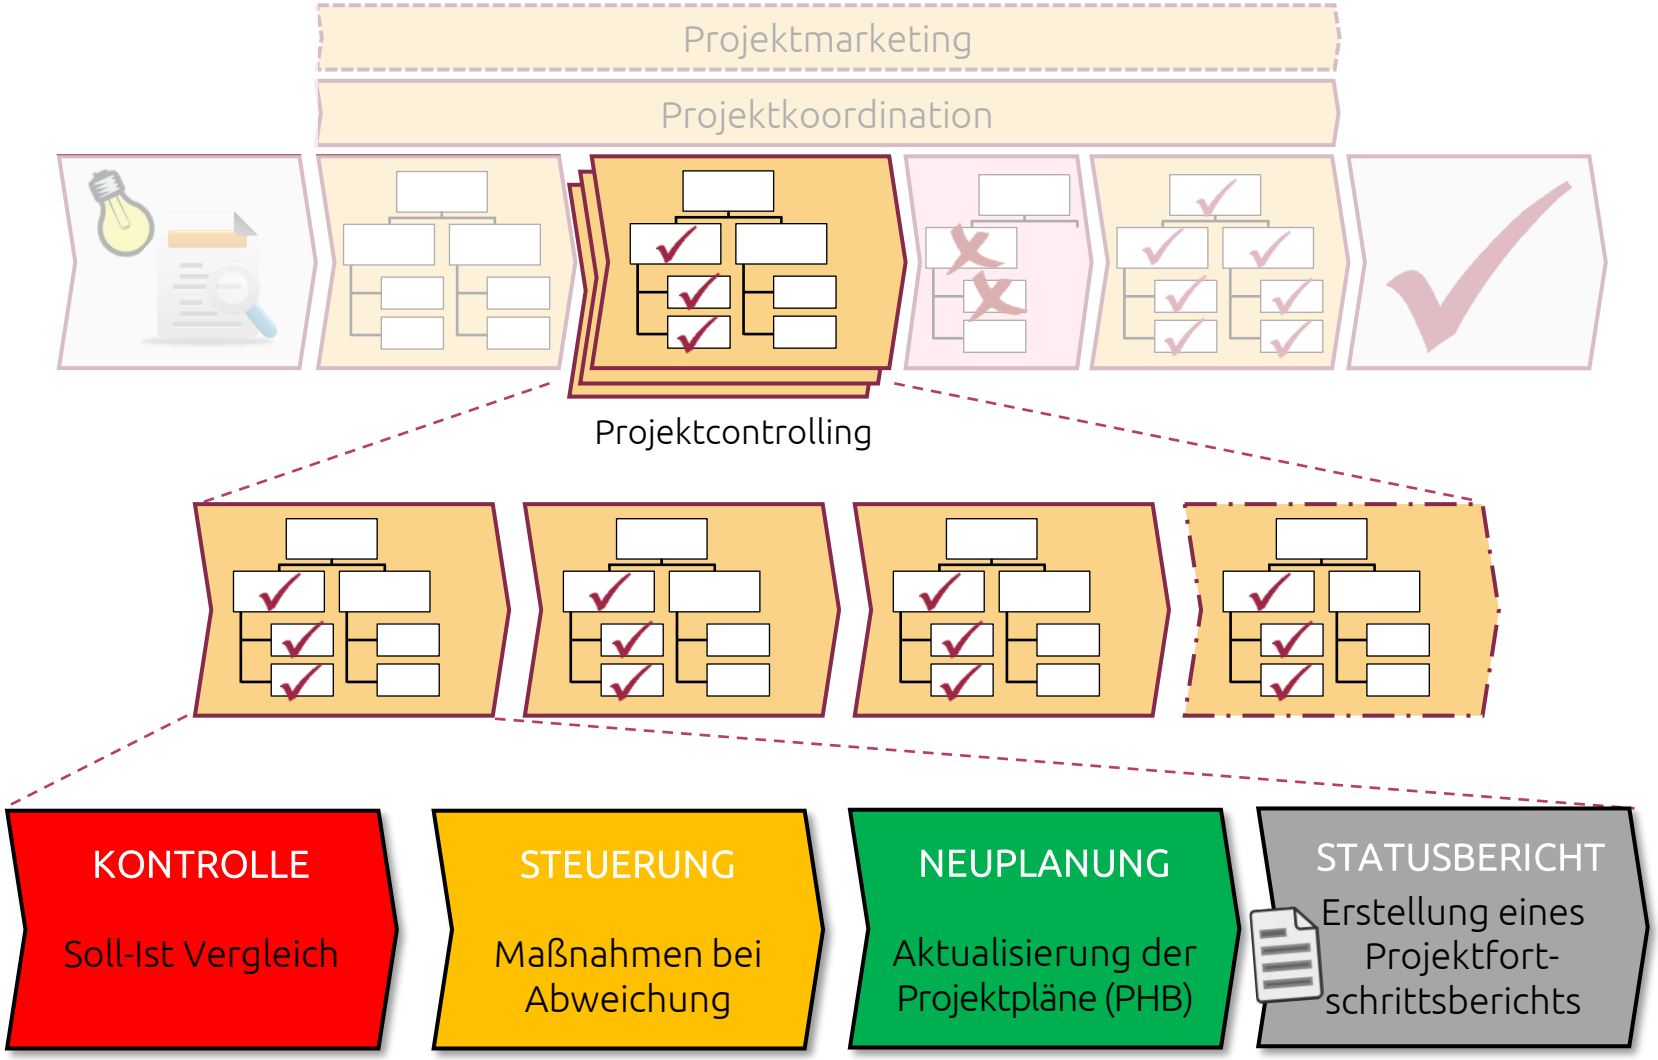

Projektcontrolling-Zyklus

KONTROLLE

Soll-Ist Vergleich

Erfassen des IST-Zustands und Vergleich mit SOLL-Zustand

STEUERUNG

Maßnahmen bei Abweichung

Bei Abweichung IST vom SOLL Zustand: Planung von steuernden Maßnahmen

NEUPLANUNG

Aktualisierung der Projektpläne (PHB)

Aktualisierung der Projektpläne (PHB) – Anpassung an aktuelle Situation

STATUSBERICHT

Erstellung eines Projektfort-schrittsberichts

Erstellung eines Projektstatusberichts (Projektfortschrittsbericht) -> Vorlage bei Projektauftragsgebersitzung (PAG)

Leistung Soll-Ist-Vergleich

KONTROLLE
Soll-Ist Vergleich

- Leistungsfortschritt der AP feststellen und in PSP, Gantt-Chart und /oder AP Abnahme eintragen
- Leistungsfortschritt ist in AP Spezifikation festgelegt

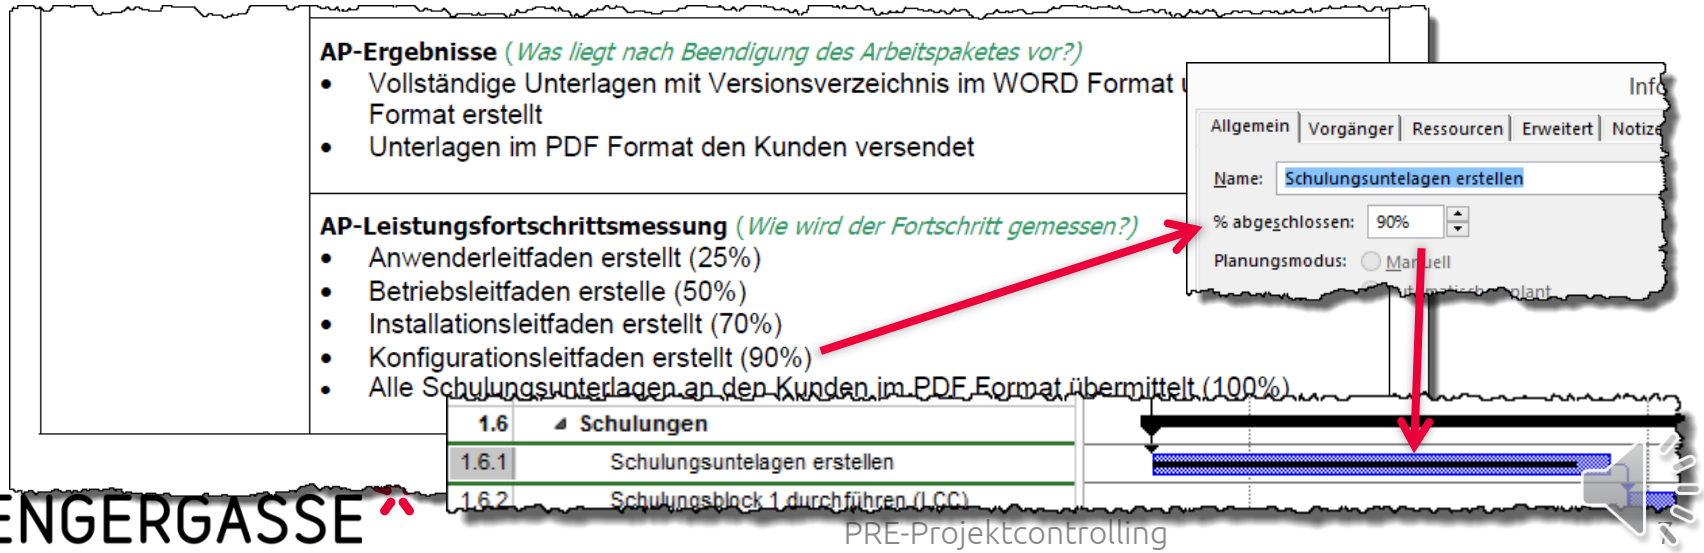

Termine Soll-Ist-Vergleich

KONTROLLE

Soll-Ist Vergleich

- Meilensteinplan
  aktuelle Plantermine
  und Ist Termine

1.11 Projektmeilensteinplan

standard projekthandbuch 001	PROJEKT-MEILENSTEINPLAN			
PSP-Code	**Meilenstein**	**Basis-termine**	**Aktuelle Plantermine**	**Ist Termine**
1.1.1	Projekt gestartet	1.8.2017		1.8.2017
1.2.7	Detailplanung angeschlossen	20.9.2017		20.9.2017
1.6.5	Inbetriebnahme abgeschlossen	12.11.2017	28.11.2017	28.11.2017
1.7.3	Monitoring an Kunden (ITO) übergeben	15.12.2017	7.1.2018	
1.1.7	Projekt abgeschlossen	15.1.2018	15.2.2018	

- Balkenplan
  In MS-Projekt auf Basis des BASISPLANS

1.6	**Schulungen**
1.6.1	Schulungsuntelagen erstellen
1.6.2	Schulungsblock 1 durchführen (LCC)



- einfache Listen

			Termine				A
6			Plan		Ist		
7	PSP	Phase / Arbeitspaket	Start	Ende	Start	Ende	in
30	1.5	SCHULUNGEN & TESTS					
31	1.5.1	Intergrationstest durchführen	14.10.2015	14.10.2015	17.10.2015	18.10.2015	
32	1.5.2	KeyUserSchulung KOFAX abhalten	20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	20.10.2015	
33	1.5.3	Kundentests Kofax durchführen	21.10.2015	21.11.2015			

Ressourcen/Kosten Soll-Ist-Vergleich

KONTROLLE

Soll-Ist Vergleich

pma
PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA

1.13 Projektpersonaleinsatzplan

standard projekthandbuch

001

PROJEKT-PERSONALEINSATZPLAN

PSP-Code	Phase/Arbeits-paket	Ressourcen-art	Planmenge in h	Adaptierte Planmenge in h	Istmenge in h	Abweichung in h
1	StundenplanApp		150	180	80	30
1.1	Projekt-management		30		18	
1.1.1	Projektstart - Prozess	PL	6		6	
		PTM 1	3		3	
		PTM 2	3		3	
1.1.2	Projekt koordinieren	PL	3		2	

Steuerungsmaßnahmen

STEUERUNG

Maßnahmen bei Abweichung

Steuernde Maßnahmen wenn notwendig z.B.

- Anordnung von Überstunden
- Einsatz neuer Mitarbeiter
- Einsatz neuer Technologien
- Änderung der Projektorganisation
- Änderung der Ablaufstruktur
- …

Neuplanung

- Nach Durchführung des Controlling-Workshops müssen PM-Pläne adaptiert werden!

ACHTUNG: Versionierung

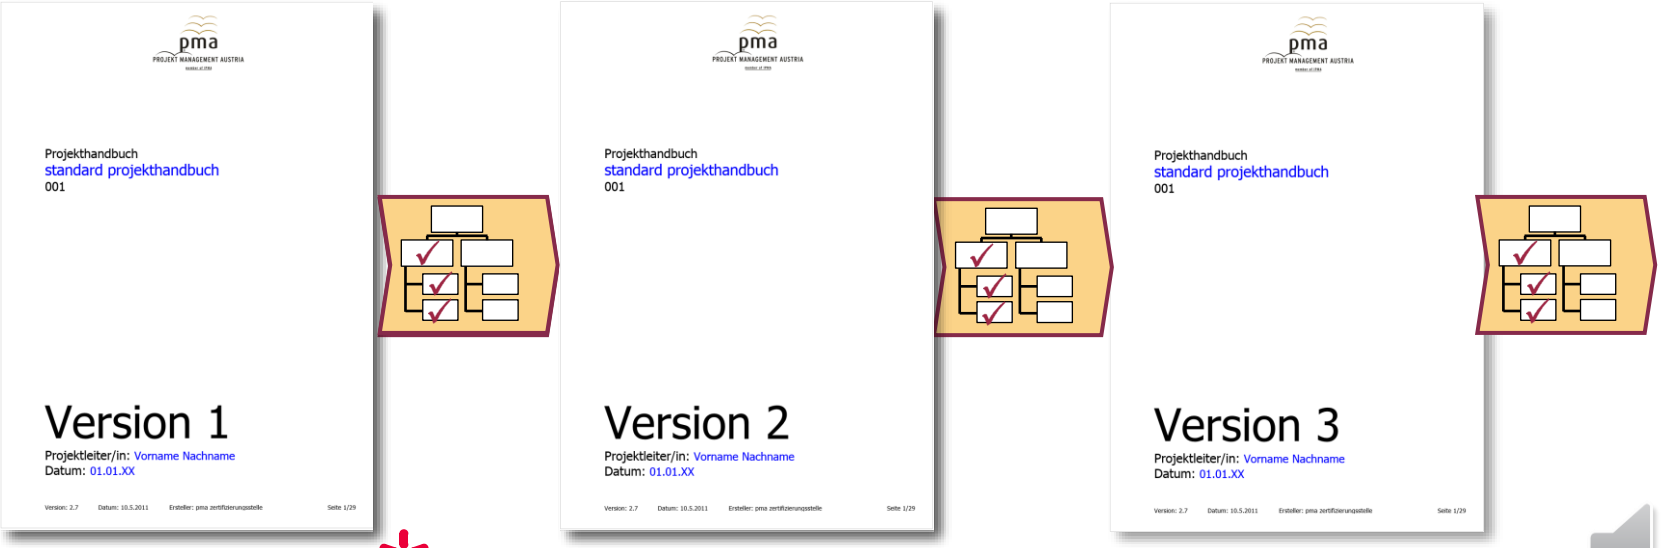

Projektstatusbericht (PMA)

STATUSBERICHT
Erstellung eines Projektfort-schrittsberichts

<<LOGO>>

Projekt: <<xxxxxxxxx>> 001	PROJEKT-FORTSCHRITTSBERICHT Nr <1> per <<Datum>>
Projektkrise Projekt in Schwierigkeiten Projekt planmäßig ✓	**1) Gesamtstatus** (verbale Beschreibung) •
2) Status Ziele (inhaltlich: noch im Plan, oder gibt es nicht mehr erfüllbare Ziele?) • •	**Maßnahmen:** (wenn alles plangemäß, brauchen keine Maßnahmen formuliert werden) • •
3) Status Leistungsfortschritt (z.B. anhand der Arbeitspakete-Angaben; was ist weitergegangen, ist das im Plan?) • •	**Maßnahmen:** • •
4) Status Termine	**Maßnahmen:**

Projektcontrolling - weitere Methoden (4. Klasse)

- Meilensteintrendanalyse

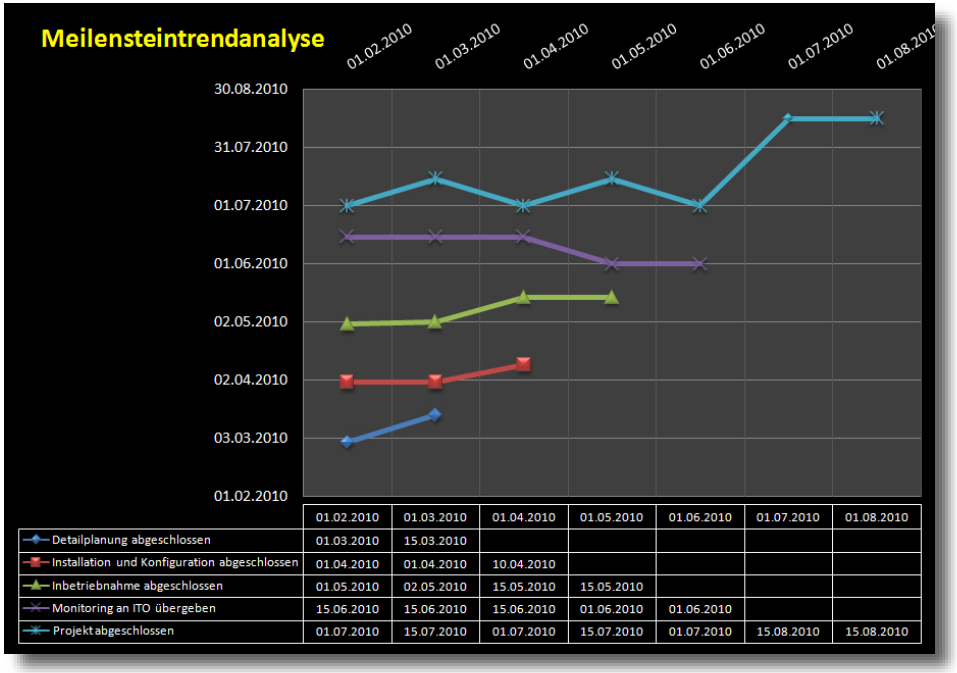

	01.02.2010	01.03.2010	01.04.2010	01.05.2010	01.06.2010	01.07.2010	01.08.2010
Detailplanung abgeschlossen	01.03.2010	15.03.2010					
Installation und Konfiguration abgeschlossen	01.04.2010	01.04.2010	10.04.2010				
Inbetriebnahme abgeschlossen	01.05.2010	02.05.2010	15.05.2010	15.05.2010			
Monitoring an ITO übergeben	15.06.2010	15.06.2010	15.06.2010	01.06.2010	01.06.2010		
Projekt abgeschlossen	01.07.2010	15.07.2010	01.07.2010	15.07.2010	01.07.2010	15.08.2010	15.08.2010

- Earned Value-Analyse
- ....

Übung: aktueller Projektstatusbericht



1. Führt für das aktuelle Projekt einen Projektcontrolling-Zyklus durch und erstellt einen Statusbericht (Vorlage PMA)
2. Erstellt eine Statuspräsentation (TERMIN)
   - Orientierung an den Inhalten des Statusberichts
   - Wer hat wie lange für welche Phase gearbeitet – Vergleich mit geplanten Aufwänden
   - Welche Tätigkeiten waren für die letzte Periode geplant und welche Tätigkeiten wurden durchgeführt
   - Welche Tätigkeiten sind für die nächste Periode geplant
   - Vortragender (pro Folie)
   - …
